Planning Herinrichting Hoofdweg Eelde-Paterswolde
Datum: 14-12-2023
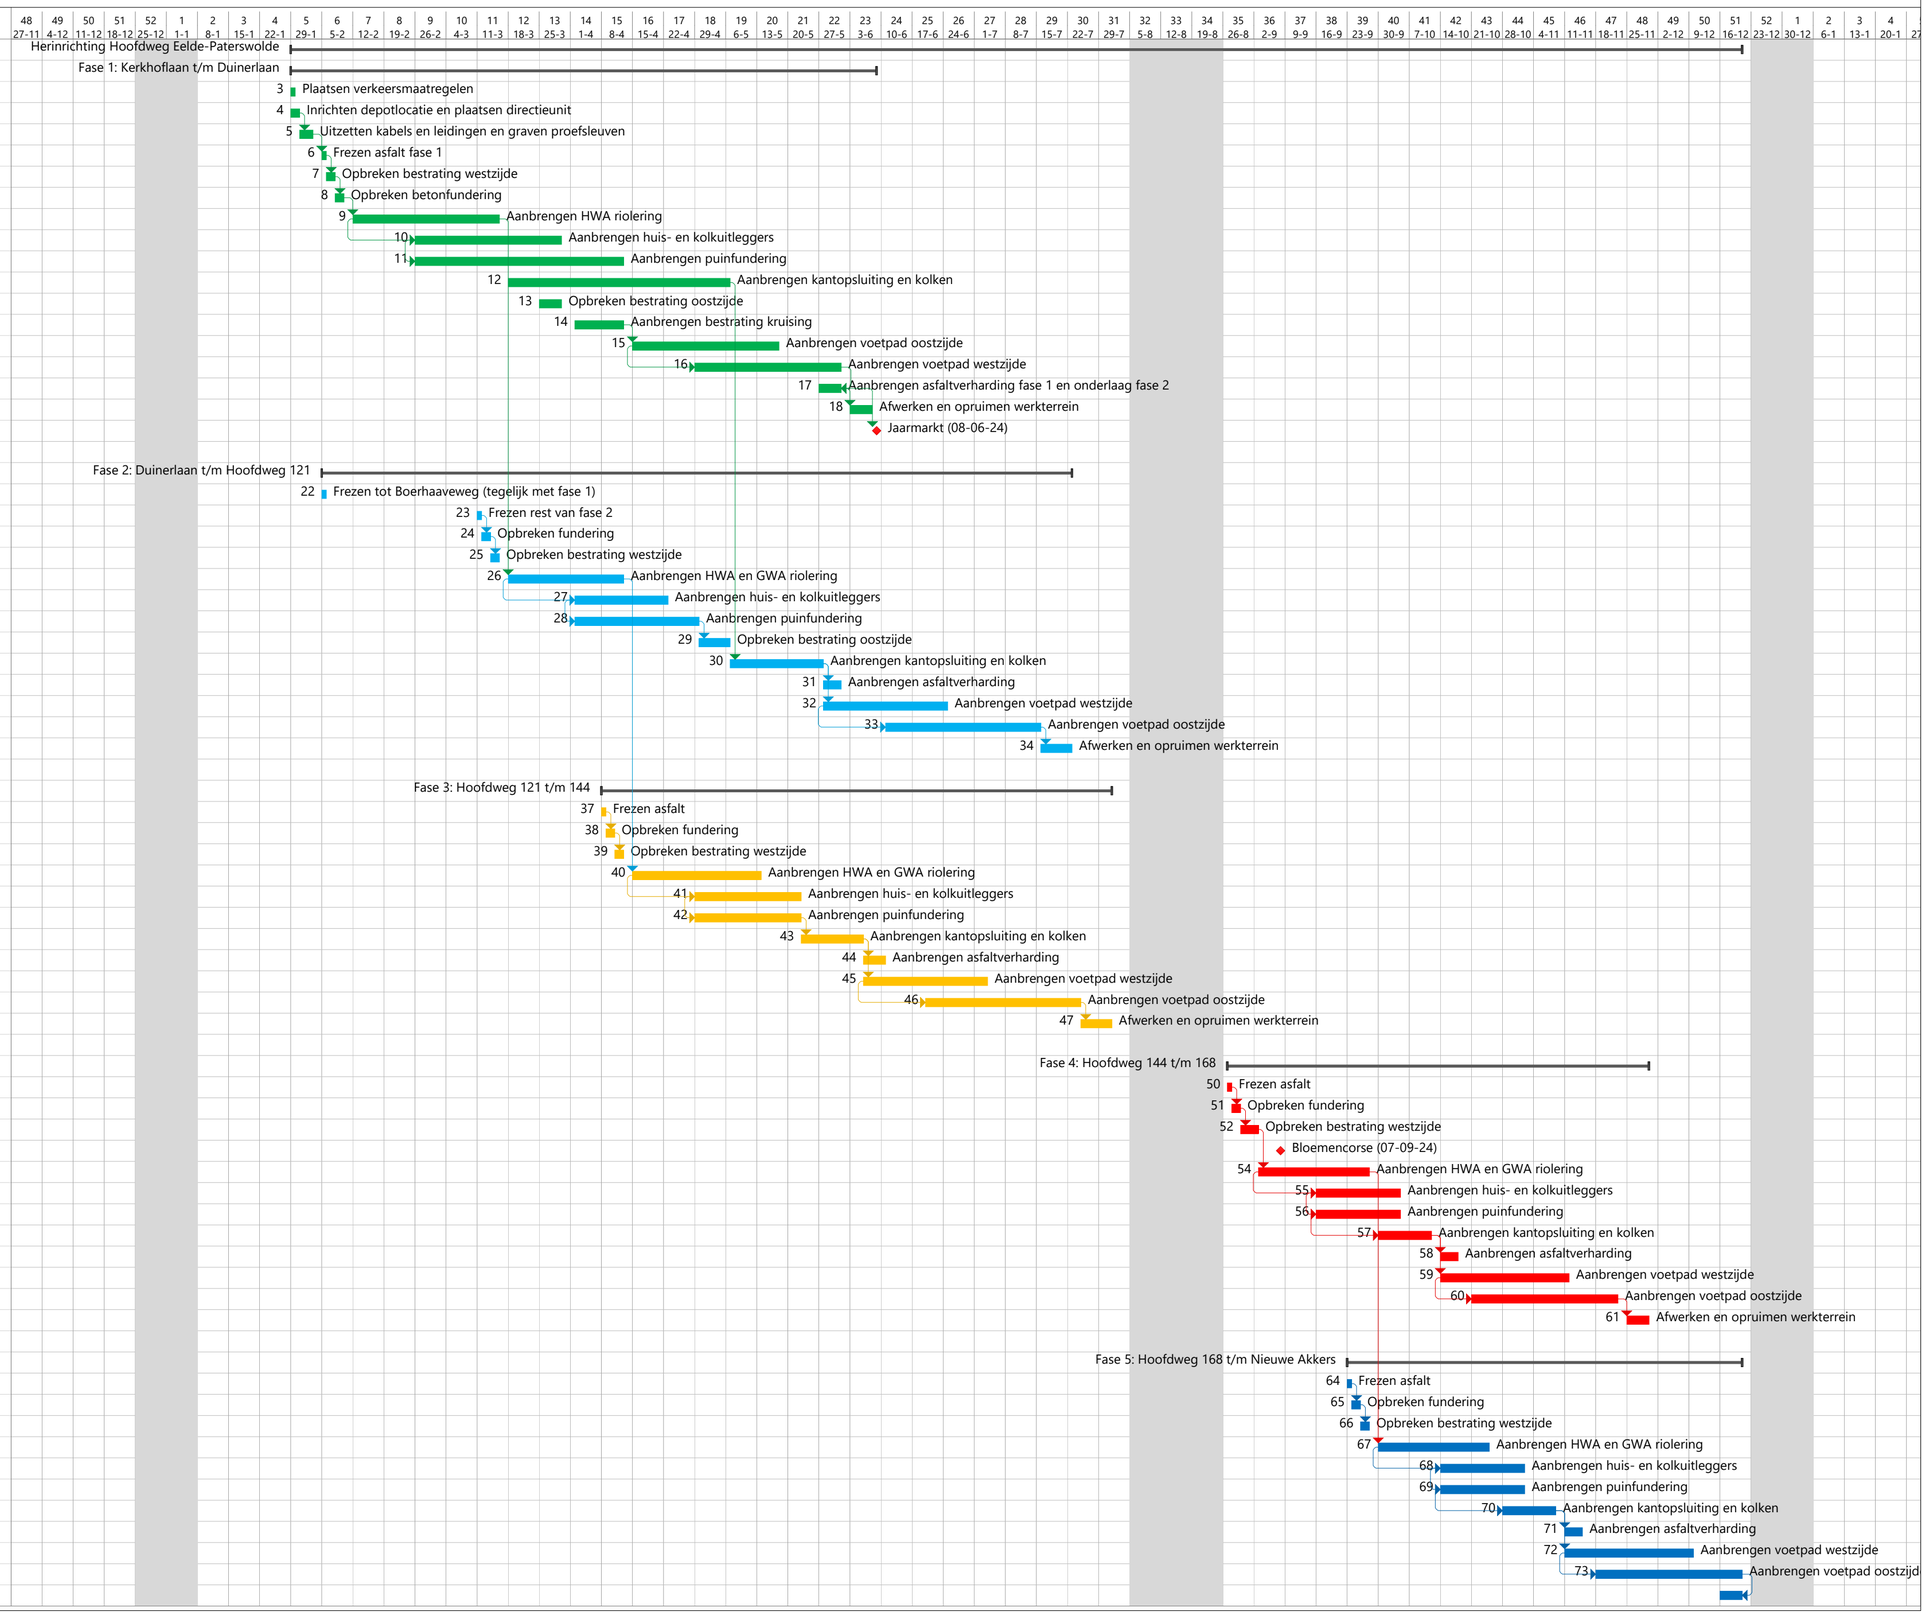
Id	Taaknaam
1	**Herinrichting Hoofdweg Eelde-Paterswolde**
2	**Fase 1: Kerkhoflaan t/m Duinerlaan**
3	Plaatsen verkeersmaatregelen
4	Inrichten depotlocatie en plaatsen directieunit
5	Uitzetten kabels en leidingen en graven proefsleuven
6	Frezen asfalt fase 1
7	Opbreken bestrating westzijde
8	Opbreken betonfundering
9	Aanbrengen HWA riolering
10	Aanbrengen huis- en kolkuitleggers
11	Aanbrengen puinfundering
12	Aanbrengen kantopsluiting en kolken
13	Opbreken bestrating oostzijde
14	Aanbrengen bestrating kruising
15	Aanbrengen voetpad oostzijde
16	Aanbrengen voetpad westzijde
17	Aanbrengen asfaltverharding fase 1 en onderlaag fase 2
18	Afwerken en opruimen werkterrein
19	Jaarmarkt (08-06-24)
20	
21	**Fase 2: Duinerlaan t/m Hoofdweg 121**
22	Frezen tot Boerhaaveweg (tegelijk met fase 1)
23	Frezen rest van fase 2
24	Opbreken fundering
25	Opbreken bestrating westzijde
26	Aanbrengen HWA en GWA riolering
27	Aanbrengen huis- en kolkuitleggers
28	Aanbrengen puinfundering
29	Opbreken bestrating oostzijde
30	Aanbrengen kantopsluiting en kolken
31	Aanbrengen asfaltverharding
32	Aanbrengen voetpad westzijde
33	Aanbrengen voetpad oostzijde
34	Afwerken en opruimen werkterrein
35	
36	**Fase 3: Hoofdweg 121 t/m 144**
37	Frezen asfalt
38	Opbreken fundering
39	Opbreken bestrating westzijde
40	Aanbrengen HWA en GWA riolering
41	Aanbrengen huis- en kolkuitleggers
42	Aanbrengen puinfundering
43	Aanbrengen kantopsluiting en kolken
44	Aanbrengen asfaltverharding
45	Aanbrengen voetpad westzijde
46	Aanbrengen voetpad oostzijde
47	Afwerken en opruimen werkterrein
48	
49	**Fase 4: Hoofdweg 144 t/m 168**
50	Frezen asfalt
51	Opbreken fundering
52	Opbreken bestrating westzijde
53	Bloemencorse (07-09-24)
54	Aanbrengen HWA en GWA riolering
55	Aanbrengen huis- en kolkuitleggers
56	Aanbrengen puinfundering
57	Aanbrengen kantopsluiting en kolken
58	Aanbrengen asfaltverharding
59	Aanbrengen voetpad westzijde
60	Aanbrengen voetpad oostzijde
61	Afwerken en opruimen werkterrein
62	
63	**Fase 5: Hoofdweg 168 t/m Nieuwe Akkers**
64	Frezen asfalt
65	Opbreken fundering
66	Opbreken bestrating westzijde
67	Aanbrengen HWA en GWA riolering
68	Aanbrengen huis- en kolkuitleggers
69	Aanbrengen puinfundering
70	Aanbrengen kantopsluiting en kolken
71	Aanbrengen asfaltverharding
72	Aanbrengen voetpad westzijde
73	Aanbrengen voetpad oostzijde
74	Afwerken en opruimen werkterrein
